PACE

Plano. Acção. **Controlo.** Execução.

Project Delivery Pack

UMN Solutions — Technology in Service of Humans

Cliente: **BNPP Cetelem Portugal** | Data: **13 Março 2026**

Plataforma de PDCAs

CONFIDENCIAL

PACE – Plataforma de PDCAs

Gestão Integrada de Melhoria Contínua | Project Charter

SPONSOR	CHAMPION	UMN LEAD	TIMELINE
Patrícia Vitorino	Joana Boto	Gil Gaspar, Amadeu M, Rafael L	10 weeks | Kick Off: 16/02/2026

DESAFIO

A Cetelem Portugal opera num contexto de melhoria contínua activo, mas sem uma estrutura centralizada que suporte o ciclo PDCA de forma consistente: as iniciativas são criadas e geridas de forma manual e fragmentada, o reporting é moroso e dependente de esforço individual, e a ausência de uma plataforma dedicada compromete a visibilidade transversal, a rastreabilidade dos savings e a capacidade de escalar a cultura de melhoria contínua de forma sustentada e auditável.

OBJECTIVOS

1. Centralizar gestão de iniciativas PDCA
2. Garantir visibilidade transversal do portefólio
3. Estabelecer governance claro e auditável
4. Quantificar e reportar impacto e savings
5. Assegurar escalabilidade e replicabilidade futura

BENEFÍCIOS

1. Eliminação de rework e gestão manual
2. Redução do tempo de ciclo de aprovação
3. Rastreabilidade completa de cada iniciativa
4. Savings mensuráveis e auditáveis em tempo real
5. Decisão baseada em dados, não em estimativas

ENTREGÁVEIS

1. **Requisitos. Modelo de operações e Governance** — Documento de requisitos fechado, framework de papéis e permissões, matriz de acessos e governance.
2. **Plataforma Operacional SharePoint** — Ambiente centralizado de submissão, validação e acompanhamento de PDCAs, com perfis de acesso configurados e workflows de aprovação activos. Inclui importação dos dados Excel de PDCAs em curso.
3. **Dashboards Executivos Power BI** — Visibilidade sobre savings, taxa de implementação, volume de iniciativas e desempenho por equipa e área.
4. **Sistema de Alertas Automatizados** — Comunicações automáticas em cada transição de estado, eliminando seguimento manual e reduzindo tempo de ciclo.
5. **Requisitos e Métricas** — Estrutura de KPIs definida, modelo de dados centralizado e lógica de cálculo de savings validada com os stakeholders.
6. **Documentação e Guias de Utilização** — Materiais de suporte ao onboarding e adoção, garantindo autonomia operacional pós go-live.

Drivers

Principal: Geração de valor mensurável por iniciativa PDCA

Secundário 1: Eficiência operacional e redução de tempo de ciclo (17 K€/ano; 80% Tempo de submissão)

Secundário 2: Automação do Reporting (12 K€/ano)

Secundário 3: Redução de Follow-Up Manual

Âmbito

- Plataforma PDCA SharePoint & Dashboards Power BI com inclusão de PDCAs em curso.
- Modelo de governance e documentação operacional
- Todos os colaboradores Cetelem Portugal

FORA DO ÂMBITO:

- Gestão de Transformação
- Desenvolvimentos adicionais pós go-live não previstos no âmbito contratual

Gantt Chart

W10 — Go-Live Plataforma Plataforma PACE + dashboards Power BI + alertas automáticos operacionais em simultâneo. Pacote completo entregue.

Detalhes por Fase

STREAM 01 — PLATAFORMA PDCA & GOVERNANCE

W1–W2
Marco M1

Fecho de Requisitos & Mapeamento Operacional

Consolidação de requisitos funcionais, mapeamento do processo real e definição do modelo de navegação UX.

- Documento de requisitos
- Mapa de operações
- Modelo de navegação

W2–W3
Marco M2

Modelo de Governance & Fluxos de Aprovação

Formalização de papéis, níveis de decisão e estrutura de permissões por perfil.

- Framework governance
- Matriz de acessos

W1–W5
Marco M3

Implementação Estrutural & Configuração

Configuração de listas, fluxos e permissões na plataforma. Garantia de coerência end-to-end.

- Plataforma funcional
- Fluxos testados
- Perfis configurados

W6–W7
Marco M4

UAT & Entrega da Plataforma

Validação com utilizadores-chave e formalização da aceitação. A plataforma fica disponível para submissão de iniciativas PDCA. Os dashboards estão ainda em desenvolvimento.

- Evidências de teste
- Ata de aceitação
- Plataforma disponível

STREAM 02 — AUTOMAÇÃO & ANALYTICS

W4–W5
Marco A1

Requisitos Analíticos & KPIs

Definição de métricas de tração, savings, lead time e taxa de implementação. Estrutura de acesso a dashboards.

- Requisitos analíticos
- Estrutura de KPIs

W4–W7
Marco A2

Modelo de Dados Centralizado

Modelo lógico de dados com consistência entre plataforma e reporting. Preparação de ETL e estrutura de integração.

- Modelo de dados
- Estrutura ETL

W6–W8
Marco A3

Dashboards Power BI

Desenvolvimento de dashboards executivo e operacional com filtros, segmentações e segurança por perfil. Início após estabilização do modelo de dados.

- Dashboard executivo
- Dashboard operacional
- Segurança por perfil

W7–W8
Marco A4

Alertas & Comunicações Automatizadas

Triggers automáticos por estado, SLA e savings. Notificações configuradas e testadas em paralelo com o desenvolvimento dos dashboards.

- Sistema de alertas
- Testes de disparo

W9–W10
Marco A5

Validação Power BI & Aprovação

Validação dos dashboards com utilizadores-chave e gestão. Ajustes finais e aprovação executiva antes do Go-Live.

- Dashboards validados
- Aprovação executiva

Requisitos da Plataforma

Prioridade: Must Have | Should Have | Nice to Have

GERAL

G01	Perfis de acesso, ciclo de vida do PDCA, regras de routing de savings e taxonomia de benefícios, como definidos na secção da Governance deste documento. Os requisitos seguintes cobrem o âmbito funcional e de interface da plataforma.	Must Have
G02	Interface integralmente em Português de Portugal, alinhada com identidade visual Cetelem.	Must Have
G03	Menus e funcionalidades não autorizados ao perfil activo são ocultados. Scope restrito a Cetelem Portugal.	Must Have
G04	Interface simples e intuitiva, com número mínimo de campos obrigatórios.	Must Have

SUBMISSÃO

S01	Formulário com campos: Acção de melhoria, Descrição, Equipa, Benefícios estimados (eficiência operacional, PNB/OPEX, redução de risco). Campos obrigatórios vs. opcionais a definir em fase de desenho.	Must Have
S02	Selecção de confidencialidade: confidencial (owner, executivos, mentores e gestores da equipa) ou não confidencial (visível na Zona Geral).	Must Have
S03	PDCA pode ser gravado como Rascunho antes de submissão definitiva.	Must Have
S04	Anexar documentação de suporte (business case, evidências, screenshots) em qualquer fase. Histórico de anexos preservado.	Should Have

ÁREAS DA PLATAFORMA

AP01	**Início:** mensagem de boas-vindas, elemento visual Cetelem/Personal Finance e contactos da equipa Mentor (email, Teams).	Must Have
AP02	**Instruções:** materiais de apoio ao processo PACE para todos os perfis. Inclusão de vídeos de onboarding Cetelem, se disponíveis.	Must Have
AP03	**Zona Pessoal:** lista dos PDCAs do utilizador separada por estado, com acesso exclusivo aos próprios. Permite editar, cancelar e declarar transições de estado.	Must Have
AP04	**Mentoria:** área exclusiva do Mentor para acompanhamento, edição, validação (início e savings finais), revisão, rejeição e atribuição de Mentor responsável por PDCA.	Must Have
AP05	**Validação:** área do Gestor com PDCAs pendentes de validação de savings. Permite validar, solicitar revisão ou rejeitar. Inclui filtros por área, tipo, estado e palavras-chave.	Must Have
AP06	**Catálogo:** PDCAs implementados disponíveis para consulta e replicação como ponto de partida. Inclui filtros de pesquisa.	Must Have
AP07	**Arquivo:** histórico de PDCAs concluídos, cancelados ou rejeitados, pesquisável conforme âmbito do perfil activo.	Must Have
AP08	**Zona Geral:** lista read-only de PDCAs não confidenciais de todas as equipas, com visibilidade diferenciada por perfil. Permite comentar e solicitar participação.	Nice to Have

NOTIFICAÇÕES E COLABORAÇÃO

NC01	Notificação por email a cada mudança de estado, com identificação da iniciativa e próximo passo esperado.	Should Have
NC02	Comentários por PDCA com histórico, timestamp e notificação ao owner. Permite menção de utilizadores e transferência de iniciativa entre utilizadores ou áreas.	Should Have
NC03	Lançamento de Desafios/Campanhas temáticas com prazo e tema definidos, geridos pelo Mentor ou Gestor.	Nice to Have

RECONHECIMENTO

RC01	Painel de reconhecimento com destaques por volume de PDCAs implementados e savings validados, com métricas por equipa e por colaborador.	Nice to Have
RC02	Sinalização visual de marcos ao atingir patamares de participação. Votação (up-vote) em PDCAs publicados.	Nice to Have

INTEGRAÇÕES

INT01	Integração com Active Directory para associação automática de perfis e hierarquias.	Must Have
INT02	Integração com Power BI para publicação de dashboards executivos e operacionais (Stream 02).	Must Have
INT03	Retenção de histórico a 5 anos (iniciativas e utilizadores).	Must Have
INT04	Importação de iniciativas existentes via Excel para migração de dados iniciais.	Must Have

Governance

Infraestrutura integrada de gestão de iniciativas de melhoria contínua. Centraliza submissão, validação e acompanhamento num único ponto de controlo operacional.

ARQUITECTURA

SharePoint + Power BI

Plataforma proprietária em ambiente Microsoft 365

ÂMBITO

Cetelem Portugal

BNP Paribas Group - Go-Live: 1 Maio 2026

FASE DO CICLO	DESCRIÇÃO	ACTORES PRINCIPAIS
1 - SUBMISSÃO	Identificação e registo da ideia de melhoria na plataforma	Colaborador - Resp. Equipa
2 - VALIDAÇÃO PROJECTO	Qualificação e classificação da iniciativa pelo Mentor	Colaborador - Resp. Equipa - Mentor
3 - EXECUÇÃO & VALIDAÇÃO SAVINGS	Implementação pelo owner, validação de savings pelo Gestor e pelo Mentor	Colaborador - Resp. Equipa - Mentor - Gestor
4 - FECHO	Declaração de implementação e registo de resultados	Mentor

Ciclo de Vida de uma Iniciativa PDCA

Sequência de estados que uma iniciativa percorre desde a ideia até ao fecho. Três estados transversais podem ocorrer em qualquer ponto do ciclo.

ESTADOS TRANSVERSAIS - PODEM OCORRER AO LONGO DE TODO O CICLO

- **Em Revisão**
  Revisão solicitada pelo Mentor ou Gestor. Recoloca a iniciativa no ciclo para resubmissão.
- **Rejeitado**
  Iniciativa não qualificada ou savings não validados. Estado terminal. Sistema notifica o autor.
- **Cancelado**
  Iniciativa abandonada por decisão do owner. Estado terminal.

Modelo de Perfis e Permissões

Cinco perfis operacionais com capacidades e acessos distintos.

1. HIERARQUIA DE PERFIS

N	N+1	N+2 / N+3 / FALLBACK COMEX	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL
Colaborador	**Responsável de Equipa (RE)**	**Gestor**	**Mentor**	**Executivo**

2. PERFIS

N
Colaborador

Perfil por omissão. Submete e gere as suas próprias iniciativas ao longo de todo o ciclo.

N+1
Responsável de Equipa

RE - Sem função de validação no workflow. Acompanha e colabora nas iniciativas da sua equipa.

N+2 / N+3 / FALLBACK COMEX
Gestor

RD ou RF - partilham o mesmo perfil. COMEX assume RF, quando não existe RF na equipa impactada. O sistema distribui automaticamente as iniciativas com base no tipo e valor de saving declarado.

TRANSVERSAL
Mentor

Equipa ACE - Acesso integral à plataforma e funções de administração. Configura outros Mentores.

TRANSVERSAL
Executivo

Perfil de leitura integral.

3. MATRIZ DE ACÇÕES POR PERFIL

Legenda: S Permitido N Não permitido

ACÇÃO	COLABORADOR	RESPONSÁVEL DE EQUIPA	GESTOR	MENTOR	EXECUTIVO
CICLO DE VIDA DO PDCA					
Submeter PDCA	S	S	S	S	N
Aprovar início do projecto	N	N	N	S	N
Validar savings - routing automático	N	N	S	N	N
Validar savings finais	N	N	N	S	N
Solicitar revisão	N	N	S	S	N
Rejeitar PDCA	N	N	S	S	N
Cancelar PDCA (próprio)	S	S	S	S	N
EDIÇÃO E COLABORAÇÃO					
Editar PDCA	S	S	S	S	N
Anexar evidências / documentos	S	S	S	S	N
Comentar / colaborar	S	S	S	S	N
FUNÇÕES DE SISTEMA					
Administração da plataforma	N	N	N	S	N

Edição e Colaboração: A permissão de edição de PDCAs é atribuída com base no perfil do utilizador. Os Colaboradores e RE podem editar apenas as PDCAs que submeteram ou nas quais foram chamados a colaborar. Os Gestores podem editar as PDCAs da sua equipa ou aquelas para as quais foram chamados a colaborar. Os Mentores têm permissão para editar todas as PDCAs.

4. VISIBILIDADE POR ÁREA DA PLATAFORMA

Legenda: S Com acesso N Sem acesso

ÁREA	CONTEÚDO	COLABORADOR	RESPONSÁVEL DE EQUIPA	GESTOR	MENTOR	EXECUTIVO
Pessoal	Iniciativas próprias	S	S	S	S	N
Geral	Todas as iniciativas	S	S	S	S	S
Mentoria	Gestão ACE	N	N	N	S	S
Validação	Savings em análise	N	N	S	S	S
Catálogo / Arquivo	Implementadas / Canceladas / Rejeitadas	S	S	S	S	S
Acessos e Permissões	Configuração	N	N	N	S	N

Atribuição de perfis: Colaborador é o perfil por omissão. RE, RD (Gestor), RF (Gestor) e Executivo são atribuídos via Active Directory com base na hierarquia organizacional. O Mentor é configurado manualmente por outro Mentor.

Confidencialidade: A flag de confidencialidade é definida pelo owner no momento da submissão. O RE tem acesso a todas as iniciativas da sua equipa, incluindo as confidenciais. Iniciativas confidenciais de outras equipas são visíveis apenas ao Mentor e ao Executivo.

Catálogo e **Arquivo** podem corresponder à mesma área na plataforma, com identificação distinta consoante o estado das iniciativas apresentadas - catálogo para iniciativas em curso ou concluídas, arquivo para iniciativas canceladas ou rejeitadas.

Visibilidade: As PDCAs serão apresentadas com base no tipo de perfil, sendo que os “Colaboradores” poderão ver apenas as que submeteram, enquanto que os perfis acima poderão ver todas as PDCAs (que abrangem a sua e outras equipas), com exceção para as confidenciais. PDCAs partilhadas serão visíveis independentemente do nível de acesso do utilizador, ou da confidencialidade da mesma.

Responsabilidades por Actividade

Distribuição formal de responsabilidades. R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

ACTIVIDADE	COLABORADOR	RESPONSÁVEL DE EQUIPA	GESTOR	MENTOR	EXECUTIVO	SISTEMA
Submissão da iniciativa PDCA	R/A	C/I	--	I	--	R
Qualificação e validação do projecto	C	C	--	R/A	--	R
Solicitação de revisão / esclarecimento	I	I	R/A	R/A	--	R
Revisão da iniciativa PDCA	R/A	C/I	C/I	C/I	--	R
Declaração de início de execução	R/A	I	--	I	--	R
Validação de savings - Gestor	I	I	R/A	C	C	R
Declaração de implementação	I	I	C/I	R/A	C	R
Rejeição de iniciativa	I	I	R/A	R/A	--	R
Notificações automáticas	I	I	I	I	--	R/A

R Responsible - executa **A** Accountable - responde pelo resultado **C** Consulted - contribui com input **I** Informed - recebe notificação

Governance de Aprovação

Critérios formais que determinam o routing de aprovação, os níveis de validação e o comportamento do sistema em cada estado.

1. ROUTING DE VALIDAÇÃO DE SAVINGS

Validação — **Gestor RD**

- → Soft savings (< 10 000 €)
- → Cost saving < 10 000 €
- → Sem savings declarados

Validação — **Gestor RF**

- → Soft savings (≥ 10 000 €)
- → Hard Savings
- → Savings (≥ 10 000 €)

Validação — **Executivo (COMEX)**

- → Hard saving ou savings ≥ 10 000 €
- → quando não existe RF na equipa impactada
- → *Assume a validação pelo Gestor RF*

TAXONOMIA DE BENEFÍCIOS - VERSÃO MAR 2026

CATEGORIA	HARD SAVING - P&L	SOFT SAVING - NON P&L
Redução de custos OPEX	– Redução de FTE – Redução de contratos temporários – Redução de despesas de prestadores – Redução de horas extra – Redução de material de escritório e papel *Comparação com custos N-1 ou orçamento do Ano N*	
Aumento de receita NBI	– Aumento de PNB via crescimento de vendas *Créditos, seguros, produtos complementares*	
Redução de risco Crédito	– Melhoria de eficiência de cobrança – Redução de taxa de reincidência	
Custos e riscos evitados		– Recrutamento evitado – Coimas, penalizações e custos evitados – Riscos evitados *Despesas previstas, não orçamentadas e não incorridas*
Melhoria de qualidade		– Aumento de satisfação do cliente *Fidelização e imagem*

[1] O **Executivo (COMEX)** assume a validação e permissões do Gestor RF, quando não existe RF na equipa impactada. O routing é efectuado automaticamente pelo sistema com base no tipo e valor do saving declarado, sem intervenção manual, com base na hierarquia fornecida.

2. REGRAS DE PROCESSO

DUPLA VALIDAÇÃO DE SAVINGS

— Gestor valida primeiro (aprova ou rejeita)

— Se aprovado pelo Gestor, Mentor valida em segundo

— Ambas as validações são necessárias para fechar

SOLICITAÇÃO DE REVISÃO

— Comentário sem alterar estado - não bloqueia o ciclo

— Revisão com revalidação - altera estado para *Em Revisão* e recoloca no ciclo

RASTREABILIDADE OBRIGATÓRIA

— Cada transição de estado regista Timestamp + Actor

— Histórico de comunicações preservado na plataforma

— Attachments e evidências associados ao registo

3. NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS

EVENTO	TRIGGER	DESTINATÁRIOS	CANAL
Submissão de nova iniciativa	Colaborador submete PDCA	RE + Mentor	EMAIL AUTOMÁTICO
PDCA aprovado pelo Mentor	Validação Projecto concluída	Colaborador + RE	EMAIL AUTOMÁTICO
Revisão solicitada	Mentor ou Gestor pede revisão	Colaborador + RE	EMAIL AUTOMÁTICO
Savings para validação	Colaborador solicita validação	Gestor (RD ou RF por regra de routing)	EMAIL AUTOMÁTICO
PDCA rejeitado pelo Mentor	Rejeição na fase de validação projecto ou savings finais	Colaborador + RE + Gestor	EMAIL AUTOMÁTICO
PDCA rejeitado pelo Gestor	Rejeição na fase de validação savings	Colaborador + RE + Mentor	EMAIL AUTOMÁTICO
PDCA implementado	Declaração de fecho pelo mentor	Colaborador + RE + Gestor	EMAIL AUTOMÁTICO
Comentário registado	Qualquer perfil comenta numa iniciativa	Colaborador + RE + perfil mencionado (sempre). Mentor e Gestor apenas se o comentário ocorrer na fase subsequente à sua intervenção ou a um pedido de revisão por si iniciado.	EMAIL AUTOMÁTICO

Fluxogramas

Mapeamento dos fluxos de processo da plataforma PACE — modelados em BPMN.

Visão Geral

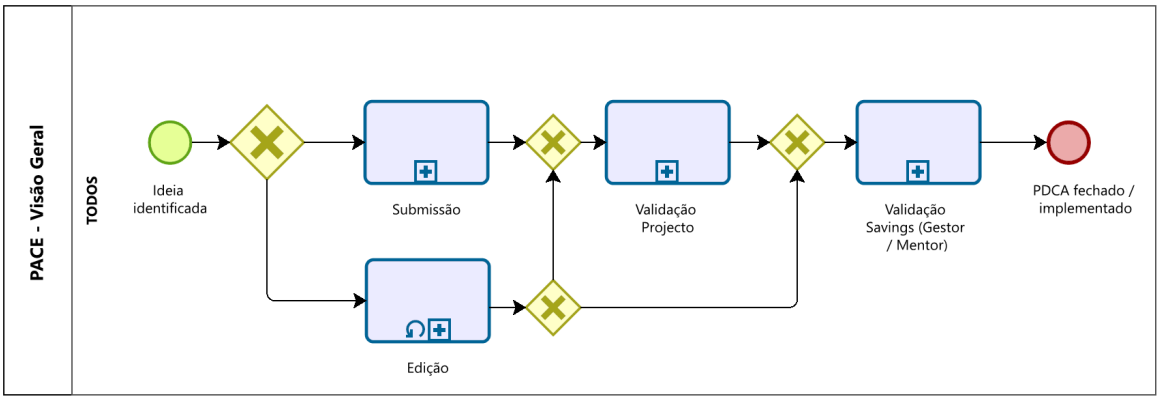

Submissão

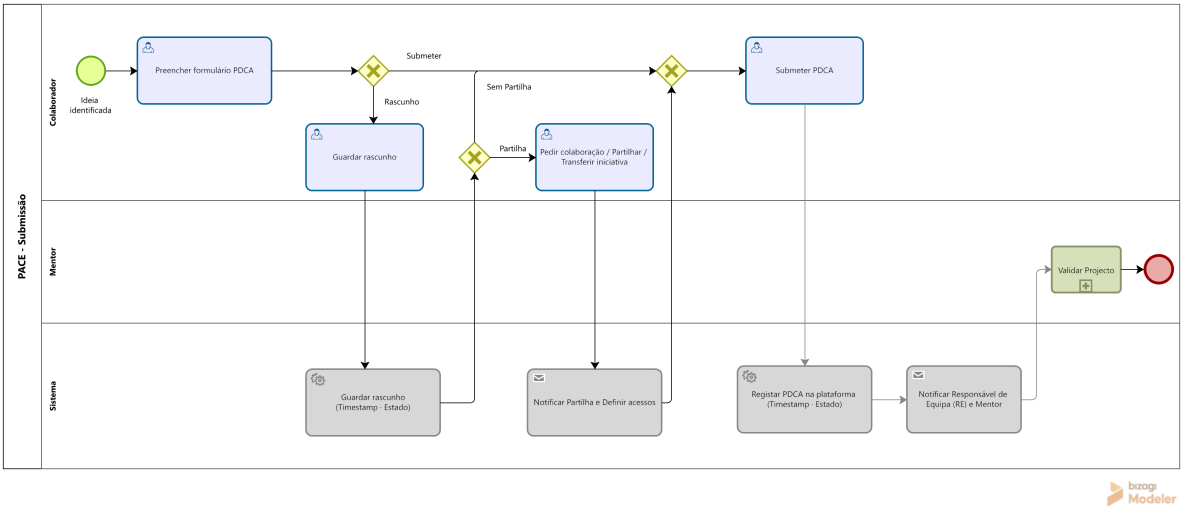

Validação

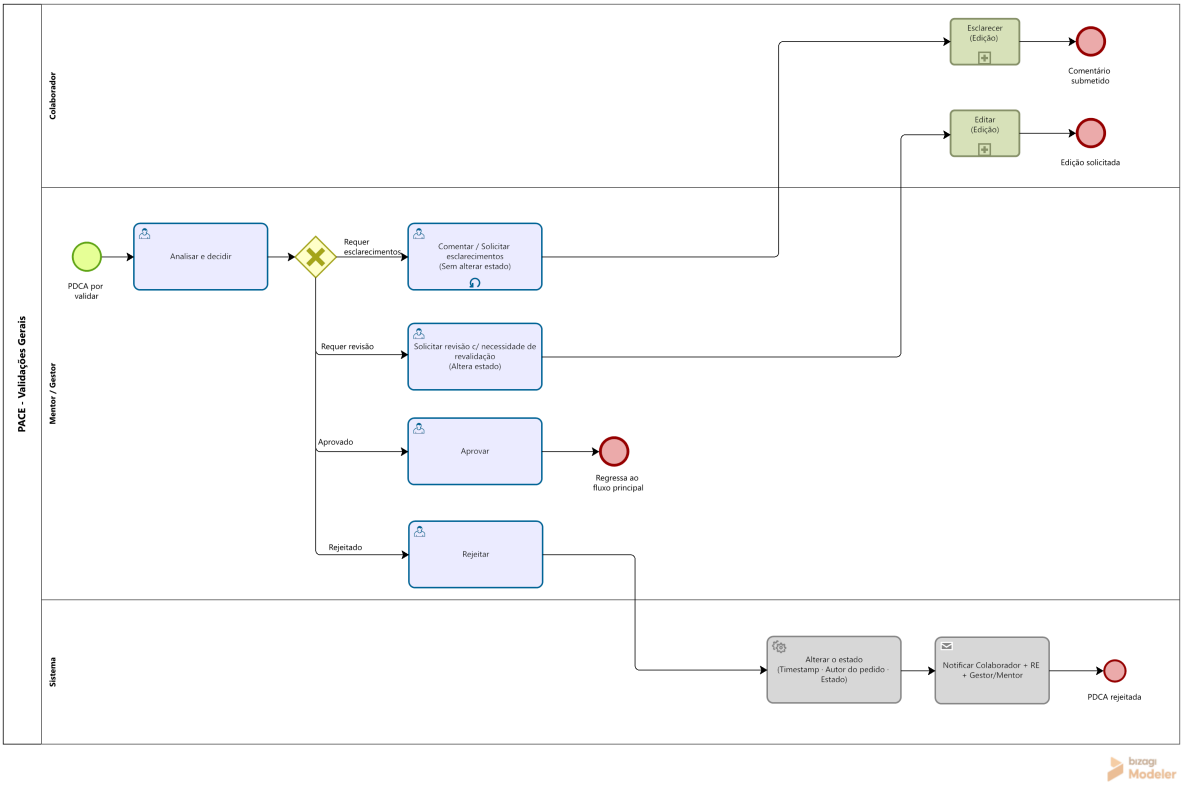

Validação de Projecto (Mentor)

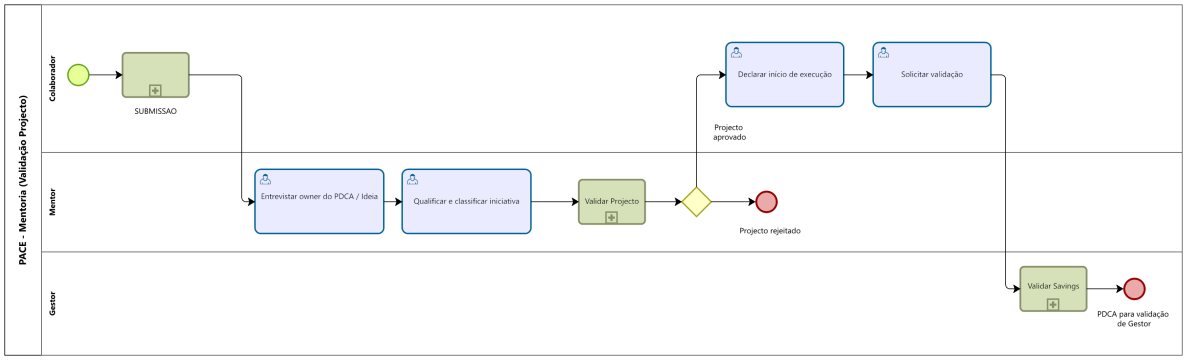

Edição / Esclarecimento

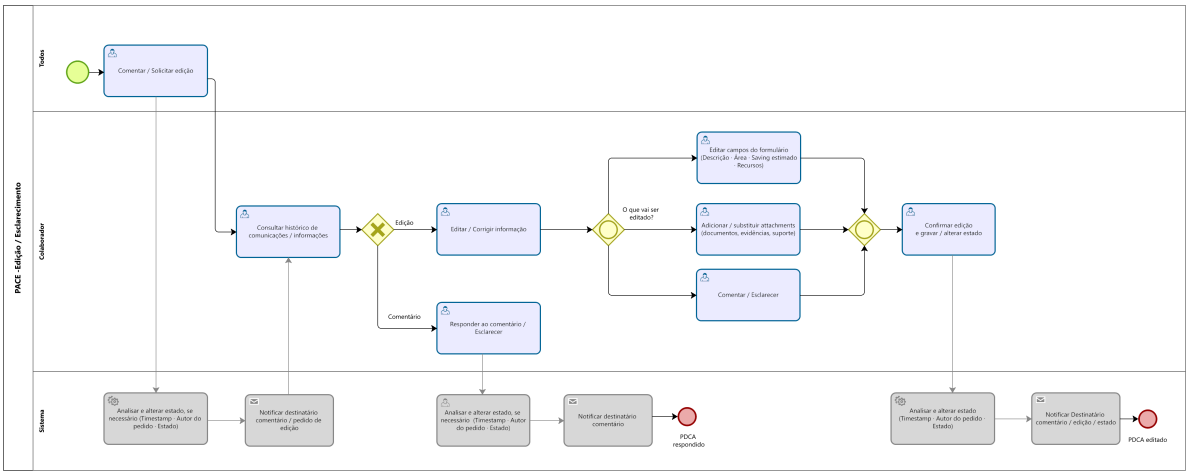

Validação de Savings

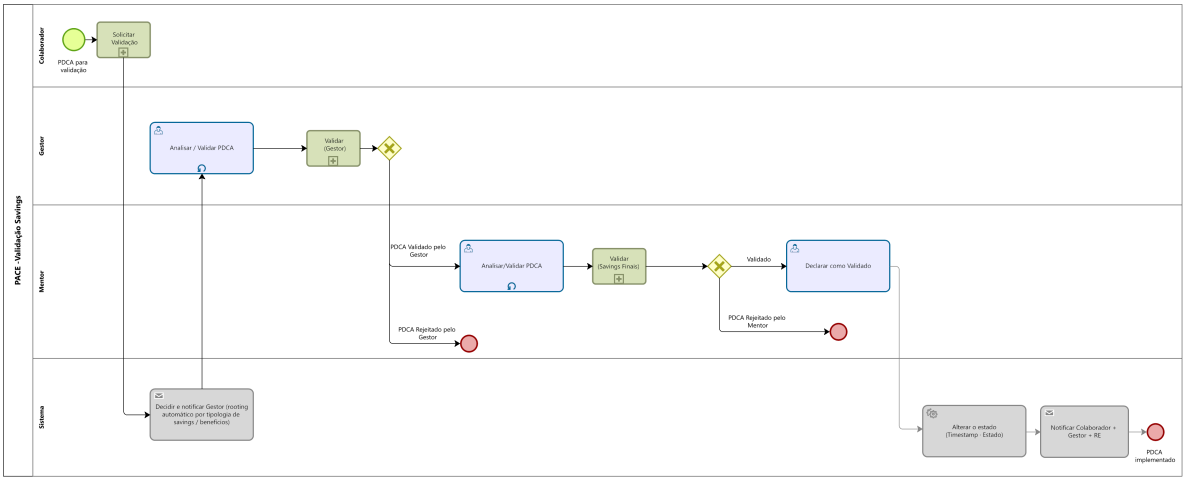
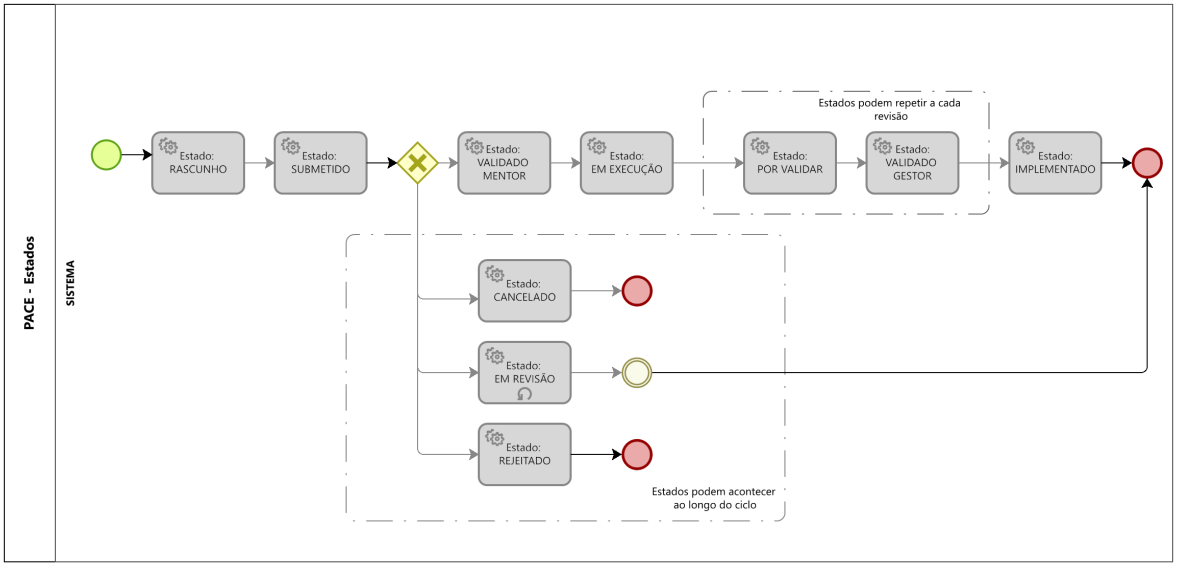
Estados do Sistema
